



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**AUTORIZACION DE PAGO DE OBRA**

L.A. MARCO ANTONIO VELEZ GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

CONTRATISTA	RICARDO RODRIGUEZ NIETO
OBRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KILOMETRO 3.8 DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO
FECHA	viernes, 4 de diciembre de 2015

POR ESTE CONDUCTO SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ESTIMACION TRES
POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE:
\$ 30,000.00

RECURSO	PROPIOS
CONTRATO N°	SMA-OPM-FP-2015-01
N° DE FACTURA	18
RETENCION 5 AL MILLAR (PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA)	
RETENCION 2 AL MILLAR (POR CAPACITACION CMIC)	

NETO A PAGAR \$ 30,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA
DIRECCION SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HUMBERTO HERNANDEZ REYNOSO
CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
CONTRALORIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RFC Emisor : RONR790915S33

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LOPEZ MATEOS No. Exterior 54 Colonia EL PUENTE Localidad
TEOCALTICHE Municipio TEOCALTICHE Estado Jalisco MEXICO CP. 47200

Sucursal :

RFC Receptor : MSM220422E73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

Calle PORTAL INDEPENDENCIA No. Exterior 4 Colonia S/C Localidad SAN
MIGUEL EL ALTO Municipio SAN MIGUEL EL ALTO Estado Jalisco MEXICO
CP. 47140

Folio Fiscal:

5091ED2F-74AC-4154-91DA-00F4A061B254

No de Serie del CSD:

00001000000203518944

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEOCALTICHE JALISCO 2015-12-04T10:55:08

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

18

Régimen Fiscal:

Regimen de las personas físicas con actividad
empresarial y profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
283.50	N/A		MTS.3 CUBICOS DE TENDIDO DE CASCAJO, EXTRACCION, CARGA , DESCARGA Y ACARREO DEL MISMO (1RA. ESTIMACION)	86.87	24627.645
670.81	N/A		MTS.2 CUADRADOS DE NIVELACION SUBARRASTRE CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE DRENES LATERALES (1RA. ESTIMACION)	1.84	1234.2904

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 25,861.94

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 4,138.06

TOTAL \$ 30,000.00

Total con letra:

TREINTA MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

AhPIfKUGEM9Zi8LNm084xwA89nyhtQ+XpqfKbVdN5VQvj8V7RbJtkxNVbaEKKwQXzswEJtEg5rTCklp9denPJlla/dhdM883R
+PjI7nItW3BLGB9fk0hTzzj0GoW7rQ47OZol4UUYChCyWg7+/2eloTQA7N2TsVWV3vozNAtmE=

Sello del SAT:

ekZs08QPAI52h3LFaxVHdKmW/+cyyD8VVhzAsc43hMv4AGBC1Iq8A5XNTfjeVvnCAfwMjyGUCb+J52Ti06JPdDGGfox5cE6sszo86ngD20KU01wq8+E17tabqNFumKMqggY26ecX
+pJFvpnp7VWAjAe56D9PKwT7LN336hXNN2o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5091ED2F-74AC-4154-91DA-00F4A061B254|2015-12-04T11:01:15|AhPIfKUGEM9Zi8LNm084xwA89nyhtQ
+XpqfKbVdN5VQvj8V7RbJtkxNVbaEKKwQXzswEJtEg5rTCklp9denPJlla/dhdM883R
+PjI7nItW3BLGB9fk0hTzzj0GoW7rQ47OZol4UUYChCyWg7+/2eloTQA7N2TsVWV3vozNAtmE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-04T11:01:15



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION No.

TRES

FECHA DE INICIO

20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO

04 DE DICIEMBRE DEL 2015

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL KM 3.8 DE LA CARRETERA, SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN AL RELLENO SANITARIO MPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

PERIODO DEL EJECUCION

25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

UBICACIÓN :

SAN MIGUEL EL ALTO

ASIGNACION No.

SMA OP FP 2015 01

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTE

NOMBRE OBRA

(A) SUMA TOTAL	\$	25,862.07
(B) SUMA COSTO DIRECTO ESTA ESTIMACIÓN	\$	25,862.07
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	\$	25,862.07
(D) 16% DE I.V.A. (0.15 x C)	\$	4,137.93
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN (C+D)	\$	30,000.00
(F) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (25.0 %) DE (E)		
(G) 5 AL MILLAR		

(I) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F)) \$ 30,000.00

NETO A PAGAR (I-G) \$ 30,000.00

AVANCES

FISICO

11.59%

FINANCIERO

11.59%

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DE CONTRATO	\$	258,912.00
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-

CONTRATO

ANTICIPO

ACUMULADO ANTERIOR	60,000.00	AMORTIZADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACIÓN	30,000.00	AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN	\$	-
ACUMULADO A LA FECHA	90,000.00	AMORTIZADO ACUMULADO	\$	-
SALDO	168,912.00	SALDO POR AMORTIZAR	\$	-
SALDO QUE SE CANCELA	0.00			

LUGAR Y FECHA : SAN MIGUEL EL ALTO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS
ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUIZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

ESTIMACION DE OBRA

TRES

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural
UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL ALTO
PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO

NOMBRE
RICARDO RODRIGUEZ NIETO



PERIODO DE TRABAJO

CUERPO DE ESTIMACIÓN

CU	CONCEPTO	CANTIDADES					IMPORTES	
		UNI	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO

1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	m3	1,680.00	283.50	567.00	850.50	829.50	\$86.87 \$	24,627.78 \$	73,883.34
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motocomformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	m2	5,600.00	670.81	1,341.62	2,012.43	3,587.57	\$1.84 \$	1,234.29 \$	3,702.87

SUMA PARCIAL ESTA ESTIMACION	\$25,862.07
16.0 % DEL I.V.A.	\$4,137.93
SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION	\$30,000.00



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS
ING. GERARDO ISRAEL LARIOS RUÍZ

CONTRATISTA

RICARDO RODRIGUEZ NIETO

GENERADORES DE OBRA



G O B I E R N O M U N I C I P A L 2 0 1 5 - 2 0 1 6



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Reconstrucción de Camino Rural

UBICACIÓN: KM 3.8 de la carretera San Miguel el Alto-Jalostotitlán al Relleno Sanitario Municipal.

CONTRATISTA:

Ricardo Rodriguez Nieto

GENERADOR

03

NÚM	CONCEPTO	Localización ejes		pza	Largo	Ancho	Alto	Uni	Result.	P. Unit.	Costo Total
1.-	Tendido de material subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (tractocompactor) en capas de 30cm. Incluye carga, descarga y acarreo del mismo.	0+270	-	0+405	1.00	135.00	7.00	0.30	m3	283.50	\$ 86.87 \$ 24,627.78
2.-	Nivelación de capa subrasante (cascajo) con maquinaria pesada (Motoconformadora) para dar nivel según proyecto. Incluye: nivelación de drenes laterales.	0+190	-	0+326	1.00	95.83	7.00	m2	670.81	\$ 1.84 \$ 1,234.29	
Subtotal = \$ 25,862.07											
IVA (16%) = \$ 4,137.93											
Total a Pagar = \$ 30,000.00											



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS
Larios Ruíz

Residente de Obra
Ricardo Rodriguez Nieto

Supervisor de Obras Públicas
Ing. Miguel Eduardo Sánchez Díaz







GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reporte Fotográfico

Reconstrucción de Camino Rural

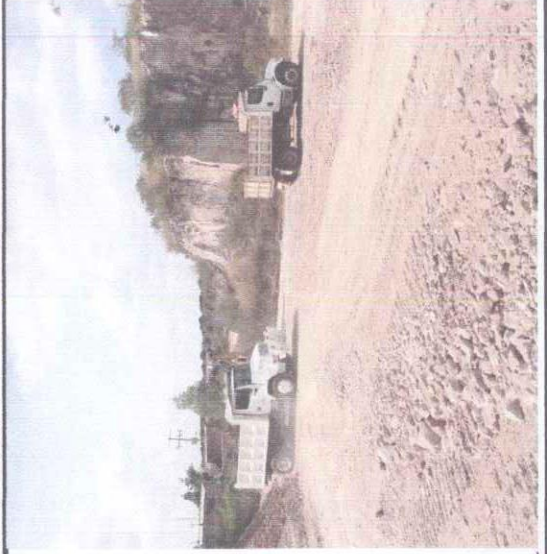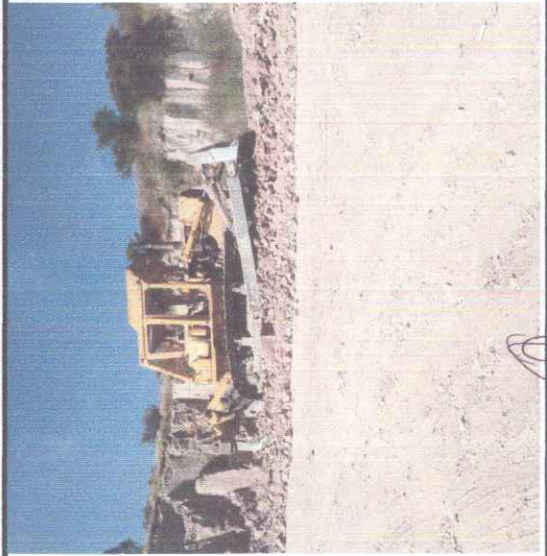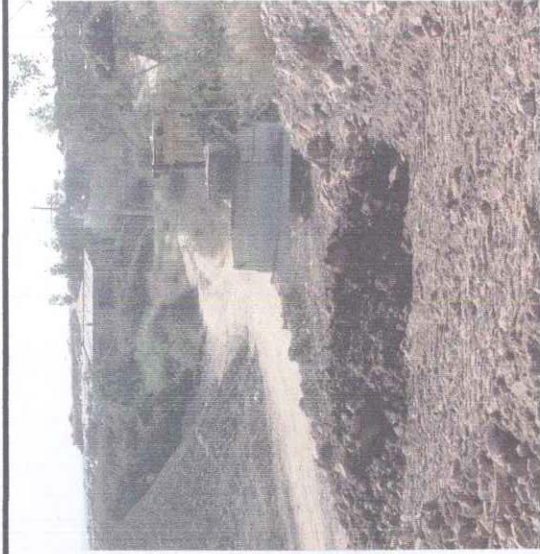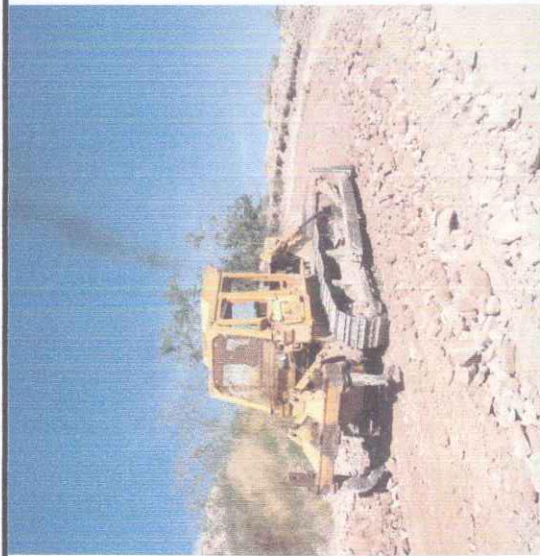

Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCION MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS
